

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	**Tekst**
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet er en realisering af et klima-lavbundsprojektet efter Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljøs Klima-lavbundsordning. Projektet omhandler genskabelse af naturlig hydrologi på 14,1 ha tørveholdige jorde ved Støttrup Bæk ved Hvilsom Plantage i Mariagerfjord Kommune. Projektet omfatter matriklerne nr. 1f, 14a, 18b og 19d Hvilsom By, Hvilsom og ligger med stort overlap til Natura2000 område nr. 30. Projektets overordnede formål er at genvåde de tørveholdige lavbundsjorde hvorved drivhusgasudledningen reduceres og naturlig hydrologi genskabes. Effekten er beregnet til 135 tons CO_2-ækvivalenter/år for hele projektområdet. Det primære virkemiddel i projektet er at genåbne og restaurere Støttrup Bæk, så vandløbet bliver mere terrænnært, og afvandingen i ådalen forringes. Projektet vil samtidig reducere udledningen af kvælstof til Hjarbæk Fjord/Limfjorden samt forbedre naturkvaliteten i området.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Projektleder: Mette Bramm, Vand og Natur, Mariagerfjord Kommune, Østergade 22, 9510 Arden, e-mail mebra@mariagerfjord.dk, mobil 24675552
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Kontaktperson: Mette Bramm
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Projektet omfatter matriklerne 1f, 14a, 18b og 19d Hvilsom By, Hvilsom; Hvilsom Hedevej 88 og Hvilsom Skovvej 35, 9500 Hobro, samt ejendom uden officiel adresse.
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Mariagerfjord Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives	Oversigtskort 1:60.000:

anlæggets placering på et søkort.	
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok angives: Projektet kan betegnes som et strækningsanlæg. Alligevel vises et oversigtskort med projektets tiltag svarende til omtrentlig målestok 1:5.500

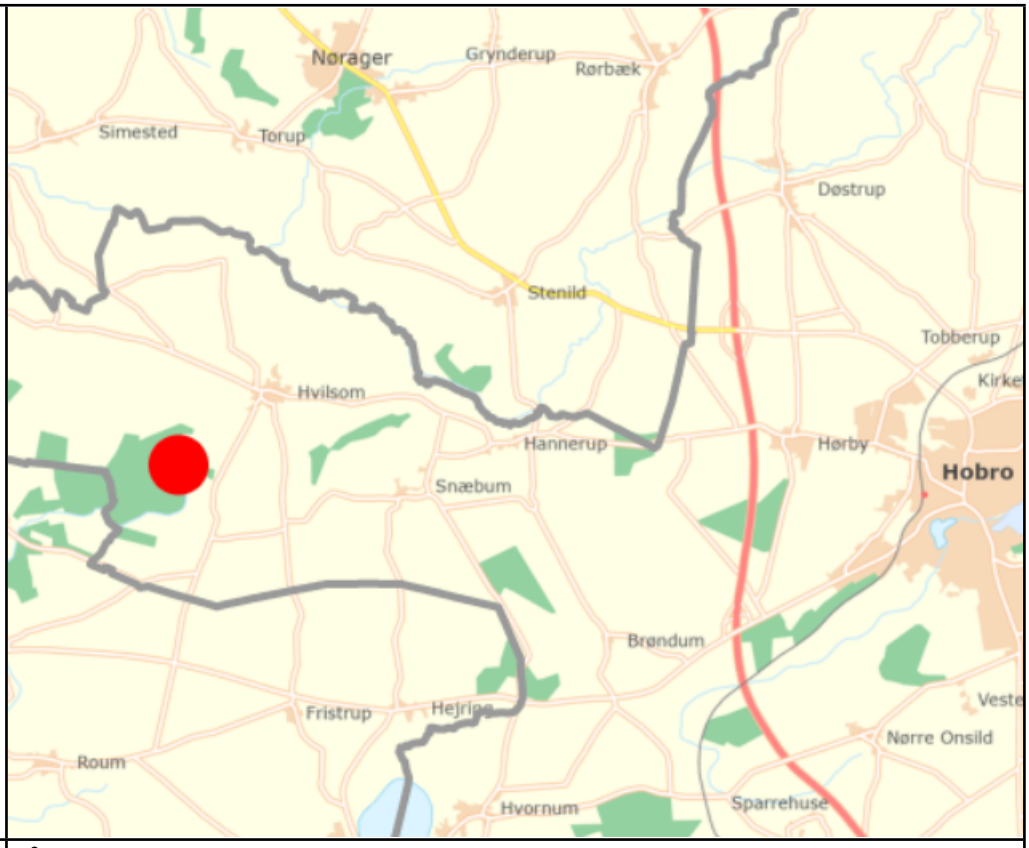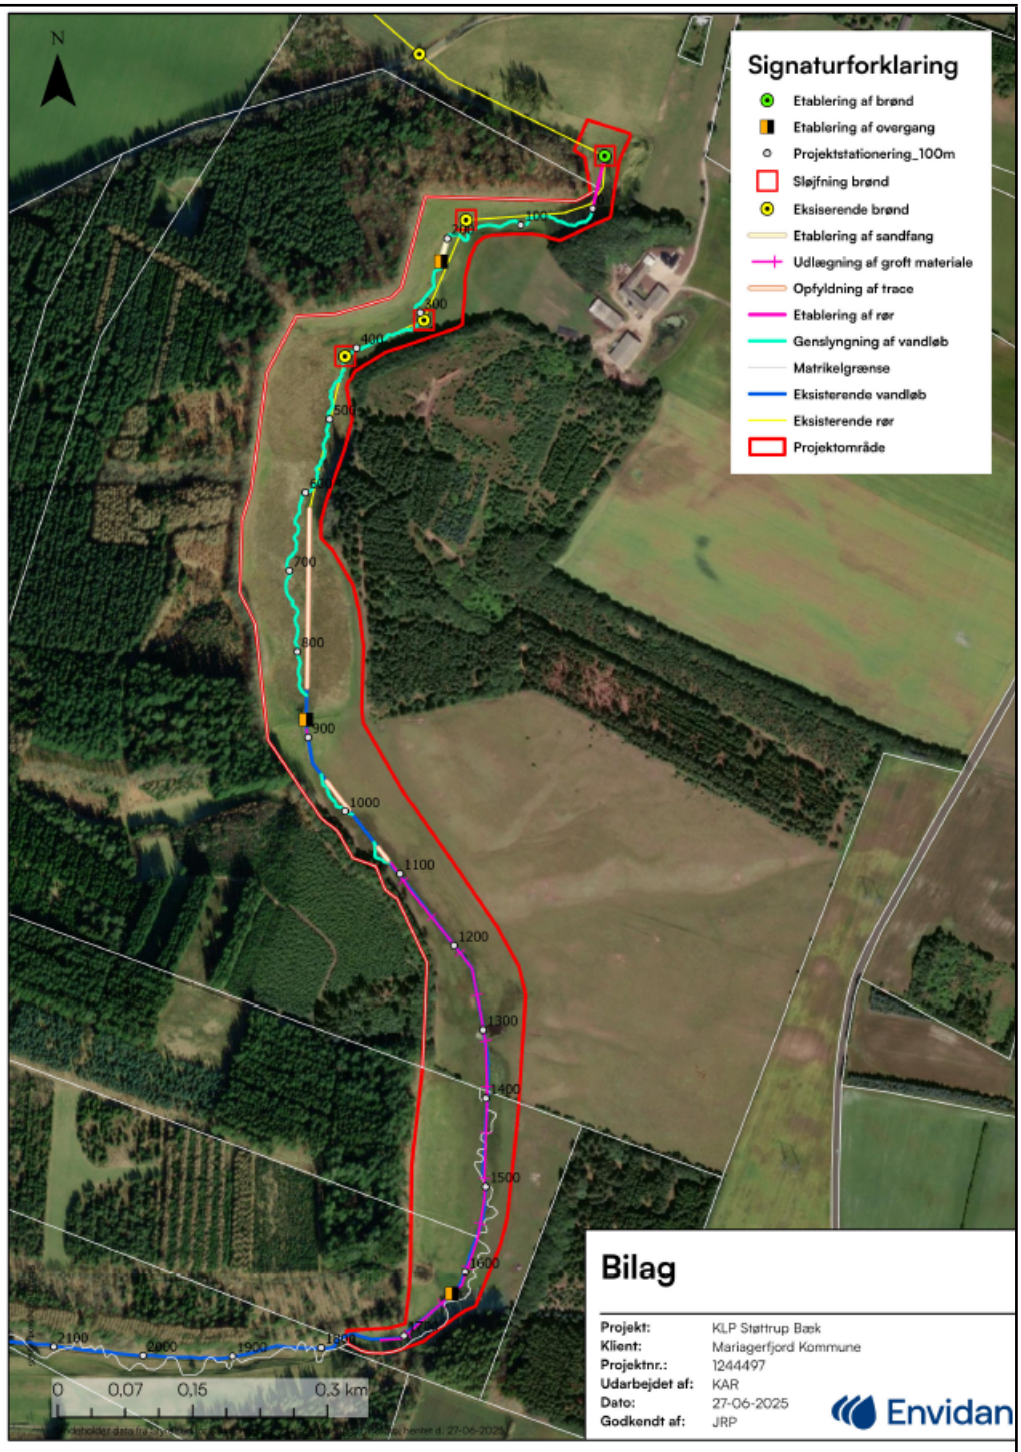

Forholdet til VVM reglerne	**Ja**	**Nej**	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om	X		Bilag 2: 10f - vandløbsregulering

miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).			
Projektets karakteristika	**Tekst**		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Projektet omfatter matriklerne: 1f Hvilsom By, Hvilsom; ejet af Søren Gøttrup, Hvilsom Hedevej 88, 9500 Hobro; 14a Hvilsom By, Hvilsom; ejet af Mads Justesen, Hvilsom Skovvej 35, 9500 Hobro; 18b og 19d Hvilsom By, Hvilsom; ejet af SAFO Skovinvest A/S, Østre Havnepromenade 26, 2. tv., 9000 Aalborg. Projektdeltagerne/lodsejerne har samtykket til at deltage i projektet. Der ydes økonomisk kompensation til lodsejerne for at lade deres arealer indgå i projektet, som en fast del af den nationale klima-lavbundsordning, administreret af Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Endvidere har projektet været fremlagt i 4 ugers offentlig høring efter bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v., § 24 fra den 20. november 2025, hvor også lodsejerne igen er hørt.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m^2 Det fremtidige samlede befæstede areal i m^2 Nye arealer, som befæstes ved projektet i m^2	Arealanvendelsen i projektområdet er langt overvejende permanent græs. Den eksisterende arealanvendelse i det endelige projektområde, er beskrevet ud fra Marker2024-temaet downloadet via Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø og afgrødetyper fordeler sig med 2,8 ha er omdrift, 10,0 ha er permanent græs og 1,2 ha er natur eller arealer der ikke indgår i de øvrige kategorier. Projektarealerne vil fremadrettet få status som beskyttet natur og en deklaration vil fastholde arealerne som natur og med den projekterede hydrologi. Bebygget areal: 0 ha. Befæstet areal 0 ha.		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m^2 Projektets bebyggede areal i m^2 Projektets nye befæstede areal i m^2 Projektets samlede bygningsmasse i m^3 Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i	Projektområdet er 14 ha stort. Der genskabes mest mulig naturlig hydrologi på arealerne med følgende virkemidler: - Åbning af rørlagt vandløbstrækning - Genslyngning af vandløb - Sløjfning af dræn Der sker ikke grundvandssænkning, men jf ovenstående sker der en generel hævning af grundvandstanden i projektområdet. Bebygget areal: 0 ha. Befæstet areal 0 ha.		

forbindelse med projektet	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Der er behov for følgende råstoffer (anslået): - Gydegrus (85 % 16-32 mm og 15 % 32-64 mm): 10 m3 - Enkeltsten (150-300 mm): 3 m3. Ingen vandforbrug. Der genereres affald i form af gammel beton rørledning og brønde (ca. 800 m). Materialet bortskaffes. Ingen spildevand. Jordbalancen er nul. Projektet forventes realiseret senest med udgangen af 2026, gerne i sommerhalvåret. Anlægsperioden vurderes til ca. 4 uger.
Projektets karakteristika	**Tekst**
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Der bruges ikke råstoffer i driftsfasen. Og der produceres ikke produkter.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af	Der genereres ikke affald, men der fortsat kan ske oprensning af sand i Støttrup Bæk, som er et delvist vandløb.

regnvand:			
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?			Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Bekendtgørelse om Miljøregulering af visse aktiviteter (Miljøaktivitetsbekendtgørelsen)
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Anlægsarbejdet vil foregå i dagstimer mandag til fredag.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende	x		Ingen støj efter endt anlægsarbejde

grænseværdier for støj og vibrationer?			
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	
Projektets karakteristika	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Der vil kunne forekomme brug af lys på maskiner afhængig af vejr/årstid i anlægsfasen. Ikke aktuelt i driftsfasen.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Lokaliteten er ikke omfattet af lokalplan

25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		x	Meget af den omkringliggende skov er fredskov. I den sydlige del af projektområdet er der et overlap med denne. Langs stort set hele den vestlige projektrand løber et beskyttet sten- eller jorddige. Hele projektområdet er desuden omfattet af skovbyggelinjer. Der sker ikke tiltag som påvirker fredsskoven og det beskyttede dige. Projekttiltagene kræver derfor ikke en dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 16, 18 og 19.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelsesloven s § 3.			Der er beskyttet natur indenfor projektområdet.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	x		Der er kendskab til forekomst af følgende bilag IV-arter i tilknytning til projektområdet: Damflagermus, odder, bæklampret og spidssnudet frø. Ingen af arterne er dog registreret i selve projektområdet, om end de forventeligt kan forekomme i området. I forbindelse med den gennemførte væsentlighedsvurdering, som del af afgørelsen efter Vandløbsloven, er potentielle påvirkninger af udpegningsgrundlaget blevet vurderet i forhold til naturtypernes og arternes resiliens over for de relevante påvirkninger fra projektet og arternes og naturtypernes potentiale for spredning og regenerering. Gennemgangen viser, at det kan udelukkes, at projektet kan have en væsentlig negativ påvirkning af arter og naturtyper på udpegningsgrundlaget for habitatområde H30 og at

			en realisering af projektet ikke vil være til hindring for opnåelse af en gunstig bevaringsstatus for habitatarter og habitnaturtyper i områderne. Projektet genskaber naturlig hydrologi og forbedre naturtypernes økologiske funktionalitet, hvilket vurderes at have en positiv effekt på arternes evt. forekomst i området efterfølgende.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Der er ikke umiddelbart nogle fredede fortidsminder i tæt tilknytning til undersøgelsesområdet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Størstedelen af projektområdet er en del af Natura2000 område nr 30, Skals Ådal mv. Projektets formål er bl.a. at genvåde kulstofholdigt tørvejord ved at genskabe hydrologien i området. Det er lodsejernes ønske at projektarealerne skal plejes og afgræsses og man vil hegne, hvorfor det må forventes, at der fremadrettet vil være en lysåben ådal med store naturværdier. Generelt vil afgræsning have en stor positiv effekt på naturen og landskabet og være væsentlig for at skabe de nødvendige forhold for udbredelse at arealer med kildevæld og rigkær. Græsningen vil hindre tilgroning og skabe forskellige mikroklimaer, variation i jordbundens næringsindhold og en heterogen vegetationsstruktur, der giver grundlag for en høj artsdiversitet af planter og en variation af levesteder for andre organismegrupper. Græsningen vil samtidig større variation i det landskabelige udtryk, da nogle områder bliver blotlagte af dyrenes aktivitet, mens andre vil være mere tilgroede. Det er dog en forudsætning for naturplejens positive effekter, at dyretrykket er passende, samt at hegningen muliggør, at dyrene kan udnytte de forskellige delområder i takt med, at afvandingen varierer. Derfor er der også projektereret adgangsmuligheder rundt i området. En realisering af projektet vurderes derfor at ville være til gunst for naturtypernes tilstand og udbredelse. Væsentlighedsvurderingen er lavet som en del af Afgørelsen efter Vandløbsloven.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	x		Der er tale om et naturgenopretningsprojekt og ændringerne vurderes positive. Grundvandsspejlet i projektområdet hæves idet der genskabes naturlig hydrologi. Således sker der en ændring i det terrænnære grundvand.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		x	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	
39. Er projektet placeret i et område,		x	

der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			
Projektets placering	**Ja**	**Nej**	**Tekst**
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato:___15-01-2026_____

Bygherre/anmelder:_____Mette Bramm_____ _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke

besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.
